Plán projektu a critical chain

ID	ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecess
1	1	**Zahajení projektu**	**8 days**	**Mon 25.9.06**	**Wed 4.10.06**	
2	2	Sběr dat a informací	3 days	Mon 25.9.06	Wed 27.9.06	
3	3	Analýza informací	5 days	Thu 28.9.06	Wed 4.10.06	2
4	**4**	**Analýza**	**45 days?**	**Thu 5.10.06**	**Wed 6.12.06**	1
5	5	Analýza stávajícího IS	3 days	Thu 5.10.06	Mon 9.10.06	
6	6	SWOT analýza	4 days	Tue 10.10.06	Fri 13.10.06	5
7	7	CRT	5 days?	Mon 16.10.06	Fri 20.10.06	6
8	8	FRT	6 days?	Mon 23.10.06	Mon 30.10.06	7
9	9	Procesní model	10 days	Tue 31.10.06	Mon 13.11.06	8
10	*10*	*Feeding buffer*	*10 days*	*Mon 13.11.06*	*Fri 24.11.06*	*9*
11	11	Detailní analýza	8 days	Mon 27.11.06	Wed 6.12.06	10
12	**12**	**Návrh nového IS**	**5 days**	**Thu 7.12.06**	**Wed 13.12.06**	**4**
13	13	Plán přechodu	5 days	Thu 7.12.06	Wed 13.12.06	
14	14	Kontrolní den 1	1 day?	Thu 14.12.06	Thu 14.12.06	12
15	**15**	**Implementace nového IS**	**41 days**	**Fri 15.12.06**	**Fri 9.2.07**	**14**
16	16	Instalace HW	3 days	Fri 15.12.06	Tue 19.12.06	
17	17	Implementace IS	15 days	Wed 20.12.06	Tue 9.1.07	16
18	*18*	*Feeding buffer*	*7 days*	*Wed 10.1.07*	*Thu 18.1.07*	*17*
19	19	Opravy v IS	3 days	Fri 19.1.07	Tue 23.1.07	18
20	20	Školení pracovníků	14 days	Wed 17.1.07	Mon 5.2.07	
21	21	*Feeding buffer*	4 days	Tue 6.2.07	Fri 9.2.07	20
22	22	Kontrolní den 2	1 day?	Mon 12.2.07	Mon 12.2.07	15
23	**23**	**Finalizace**	**10 days?**	**Tue 13.2.07**	**Mon 26.2.07**	**22**
24	24	Propojení IS	1 day?	Tue 13.2.07	Tue 13.2.07	
25	25	Aktualizace dat	1 day?	Wed 14.2.07	Wed 14.2.07	24
26	*26*	*Feeding buffer*	*4 days*	*Thu 15.2.07*	*Tue 20.2.07*	*25*
27	27	Testování	4 days	Wed 21.2.07	Mon 26.2.07	26

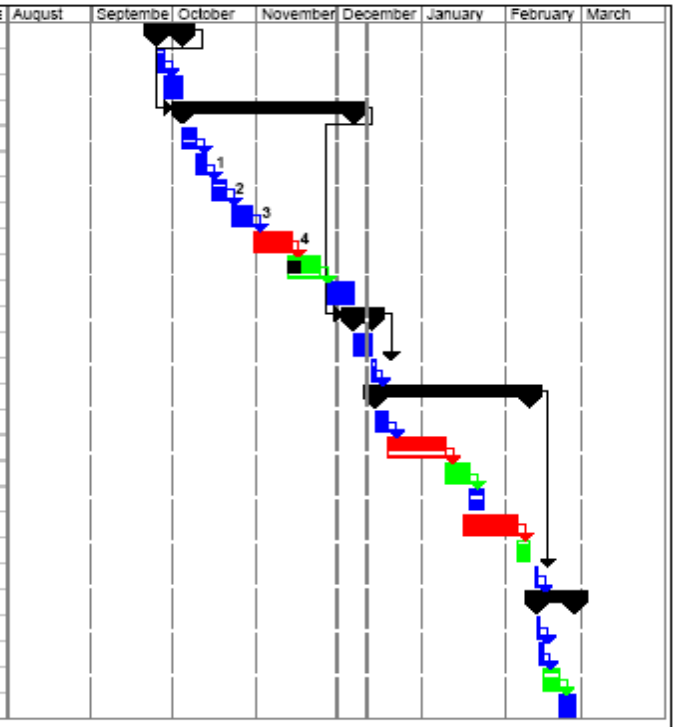

Project: Project1
Date: Tue 12.12.06

Task | Split | Progress | Milestone | Summary | Project Summary | External Tasks | External Milestone | Deadline
